



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a r s t ^{spa}
trasporti regionali della sardegna

ARST S.p.A.

Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer - Nuoro, Sassari - Alghero e della linea Metropolitana di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

progettista: Ing. Gianni Pirino

Supporto tecnico-operativo
alla progettazione:

Ing. Francesca Bianchi
Geom. Paolo Atzori
Geom. Massimo Dettori
Geom. Claudio Pireddu

OPERE DI ARMAMENTO FERROVIARIO

OGGETTO:

Cronoprogramma delle lavorazioni

NOME-FILE

SCALA:


—

REV.	MODIFICHE	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	11/2018	F,BIANCHI		
1	REVISIONE	12/2018	F,BIANCHI		

TAVOLA:

A_500_01

ID	Nome attività	Durata	Importo	Trimestre 1																																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	Allestimento del Cantiere base - Sassari	8 g	0,00																																																						
2	Rilievo ed individuazione impianti di linea Metro Sassari	2 g	1'486,02																																																						
3	Sostituzione rotaie Metro Sassari	12 g	30'527,72																																																						
4	Livellamento binari Metro Sassari	2 g	13'127,98																																																						
5	Taglio della rotaia e regolazione della tensione	14 g	11'304,08																																																						
6	Rilievo e individuazione impianti di linea Sassari Alghero	15 g	15'462,47																																																						
7	Livellamento binari linea Sassari Alghero	9 g	85'172,35																																																						
8	Taglio della rotaia e regolazione della tensione	35 g	37'788,21																																																						
9	Smobilizzo Cantiere	1 g	0,00																																																						
10	Allestimento Cantiere base - Macomer	5 g	0,00																																																						
11	Rilievo ed individuazione impianto di linea	24 g	22'972,55																																																						
12	Livellamento binari	13 g	131'077,11																																																						
13	Taglio della rotaia e regolamento della tensione	52 g	63'344,12																																																						
14	Smobilizzo cantiere	1 g	0,00																																																						

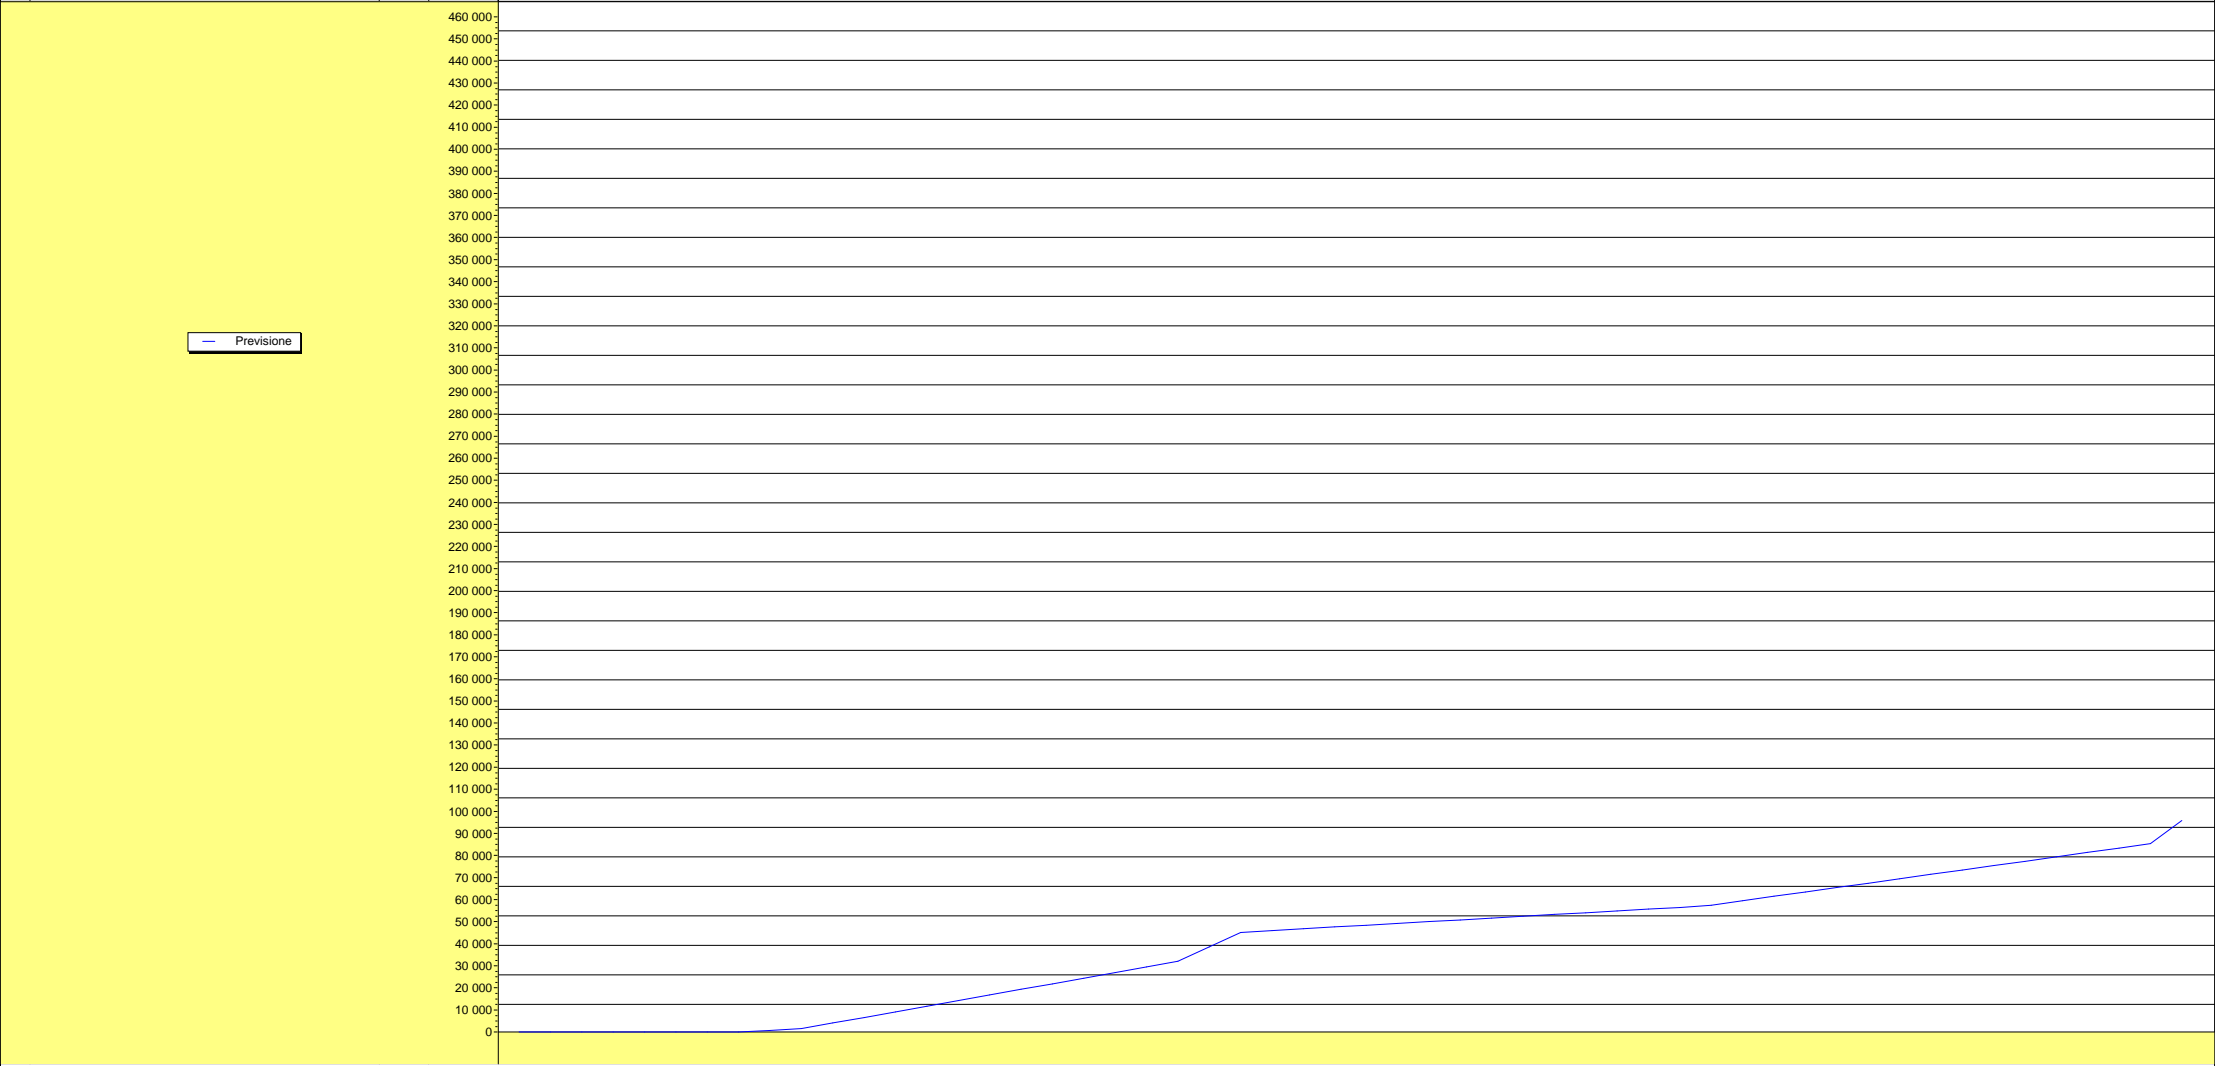

Trimestre 2

55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124

